

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1199895 WM ✓	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	16/09/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 068-Pump -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Proc Wet Utilities Supvtr

Asset General Information. / Información General Activo				
Asset No. / No. Activo		387-PP-9012		
Manufacturer / Fabricante		Sandpiper		
Model Desc. / Desc. Modelo		Pump 02 Pneumtc Sump NaHS Area Reagents Area		
P&ID		P&ID		
Parent / Padre		387-PP-1004 Pumps Sump NaHS Area		
Warranty / Garantia		NO		
Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema				
1.	verificacion de fuga en brida			
Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones				
	verificacion de fuga en brida			
Tooling / Herramientas				
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte		Qty / Cant.	Unit / Unidad
Labor Allocated / Descripción Mano Obra				
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo		OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician		1.00	6.00
Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
57107	Mancos Pérez	M.P	1.0	2.0
	Estudiante	E		
386A1	José Zanato	JZ	1.0	2.0
	Estudiante			

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 26 of / de 81

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	14-9-23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	08:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	14-9-23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	10:00

Failure / Falla	leak
Analysis / Análisis	Empaque dañado
Solution / Solución	Reemplazo / torque


Comments / Comentarios
verificar fuga de agua en tubería de descarga de la bomba - se verifico liquero y se le hizo limpieza a los Pernos y se hizo cambio de empaque y ajuste, tambien se hizo Prueba con el operador del area

WO Raised by: / Orden Creada por:	ABDIEL OMAR MARTINEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	23/08/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	MP
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	14-9-23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 27 of / de 81

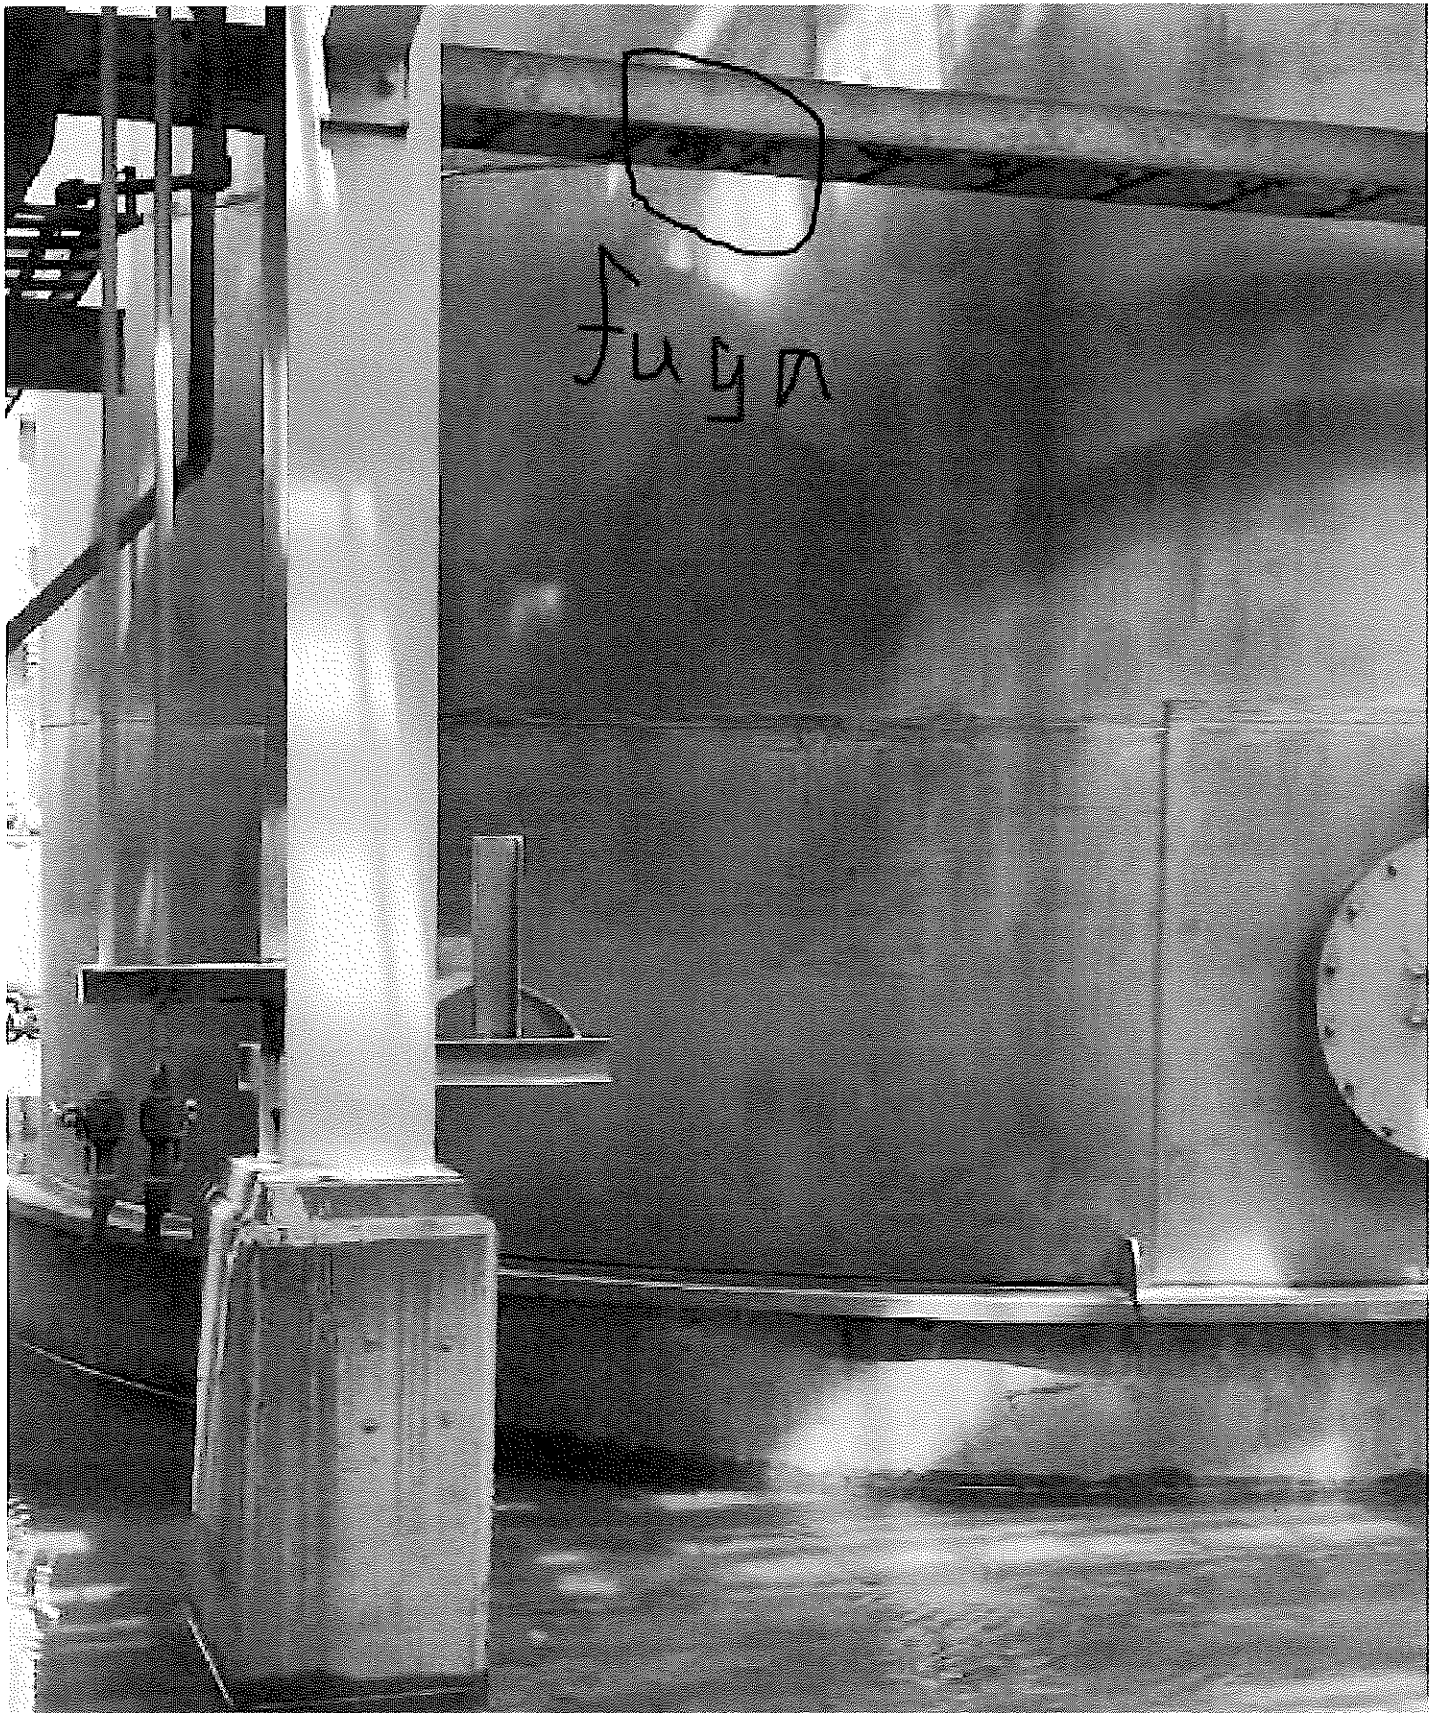

This page intentionally left blank.
